

Schulausschuss: TOP 7 – **aktuelle Schulbaumaßnahmen**



Informationen über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein





Informationen

- **Rheinschule**
- **Leegmeerschule**
- **Michaelschule**
- **Gesamtschule**





Rheinschule

- **Förderung des Ganztag**
(Infrastrukturausbau)
 - hier: Spielgeräte



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Rheinschule

- Kletterturm



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Rheinschule

- Balanciersteg.





Leegmeerschule

- **Förderung des Ganztags**
(Infrastrukturausbau)
 - hier: Gartenhaus + Spielgeräte



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Leegmeerschule

- Gartenhaus



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Leegmeerschule

- Stehwippe



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Leegmeerschule

- Balanciersteg





Michaelschule

- **Förderung des Ganztags**
(Infrastrukturausbau)
 - hier: Spielgeräte



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Michaelschule

- Beton-Tischtennisplatte
- Fun-Basketballkorb



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Michaelschule

- Balanciersteg



Schulausschuss: TOP 7 –aktuelle Schulbaumaßnahmen

Michaelschule

- 5 Stk. Sitzbänke





Gesamtschule Emmerich

- Gebäude
Paaltjessteege
- Gebäude Brink





Fassadenteile werden montiert



(Ansicht Wollenweberstraße)



(Ansicht Brink Gebäuderückseite)



Fassadendämmung (schwarz) ist abgeschlossen. Die Betonteile für die Fassade werden montiert



Schulausschuss: TOP 7 – Brink



Installationsarbeiten Heizungsanlage

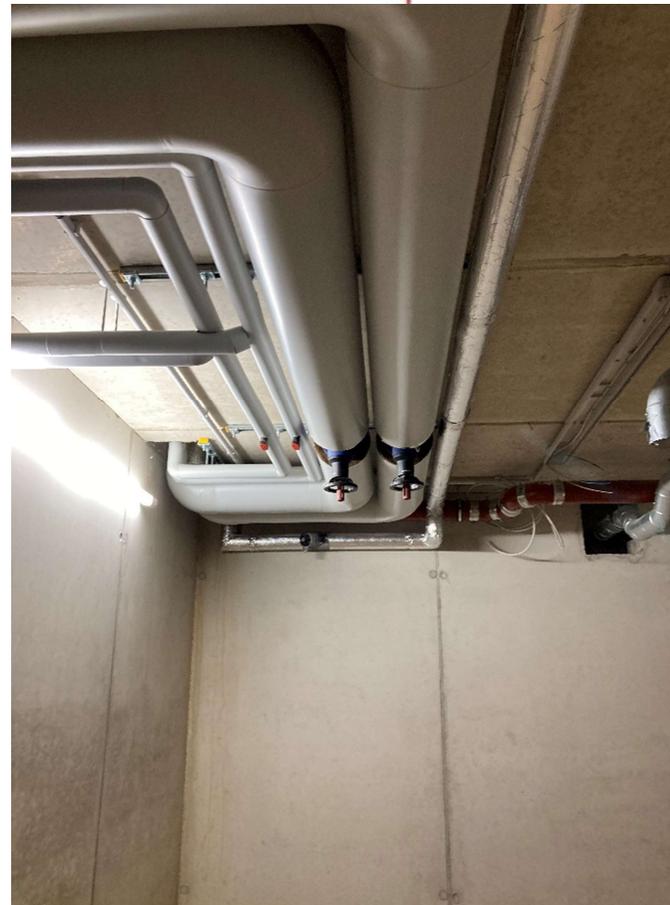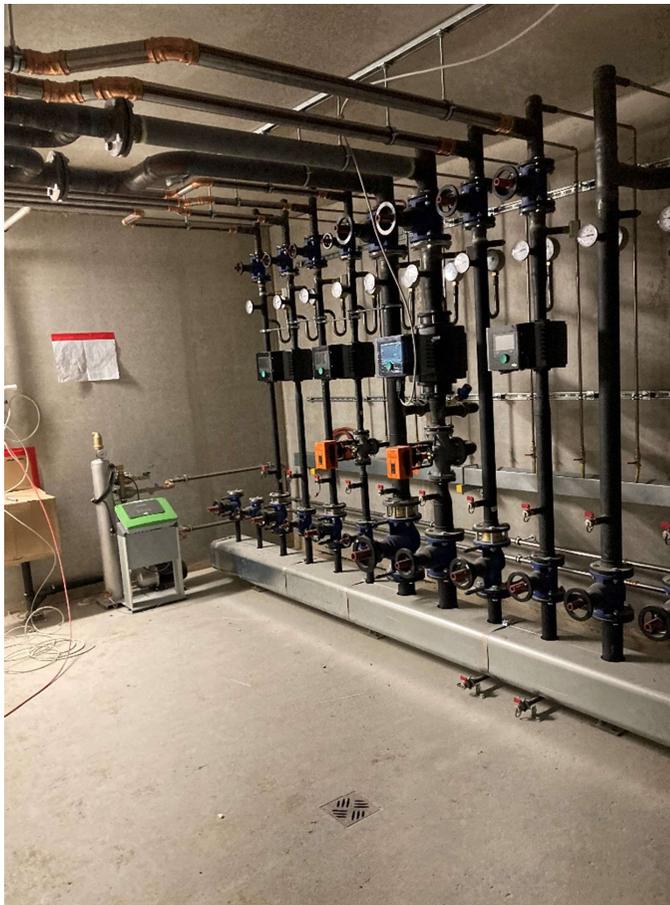



Gebäude Paaltjessteege

Bau einer Nahwärmezentrale



Nahwärmezentrale im Gebäude Paaltjessteege ist fertig montiert. Die Wärmeleitungen wurde verlegt.

Fotos von
ap-technik





Gebäude Am Brink

Bau einer Nahwärmezentrale



Die Nahwärmezentrale im Gebäude Paaltjessteege komplett installiert. Derzeit gibt es Verzögerung seitens der Stadtwerke bei der Inbetriebnahme.

Das Gebäude am Brink wird aktuell über eine mobile Heizungsanlage beheizt, damit u.a. der Estrich austrocknen kann



Schulausschuss: TOP 7 – Standort Paaltjessteege/Brink



Abbruch Mensa



Mensa wurde zurückgebaut und entkernt und wartet auf den finalen Abriss



Einbringung Fußbodenheizung




Fußbodenheizung vor dem Einbringen des Estrich ist im kompletten Gebäude abgeschlossen

Fotos von ap-technik





Einbringung des Estrichs

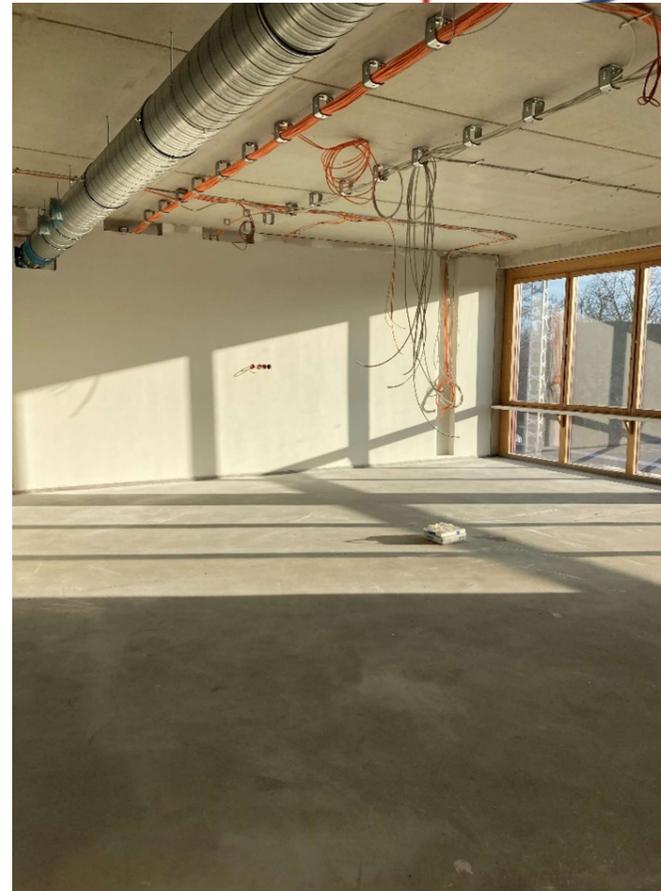


Fußboden nach Einbringung Estrich aktueller Stand in allen Räumen





Die Trockenbauwände wurden
verspachtelt

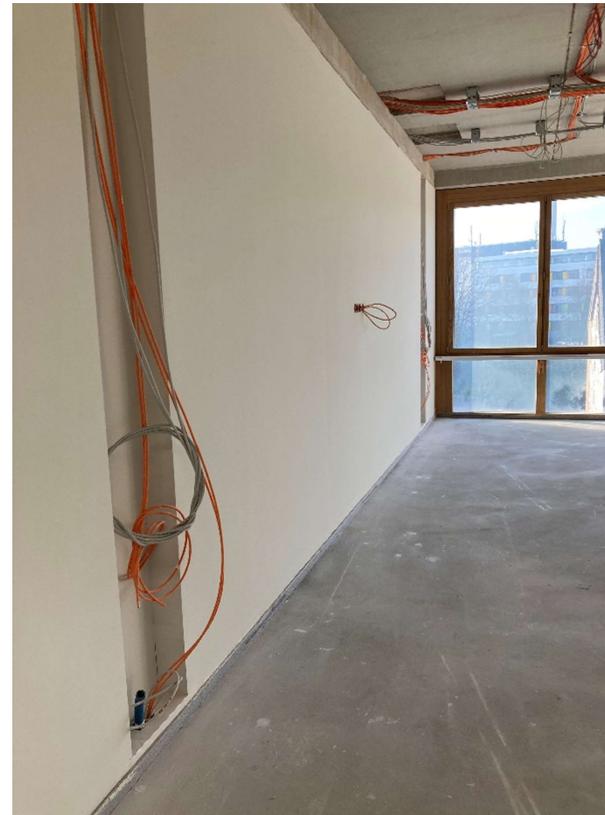

Trockenbauwände sind verspachtelt


Fotos von
ap-technik



Schulausschuss: TOP 7 – Brink



Netzwerk EDV Installation

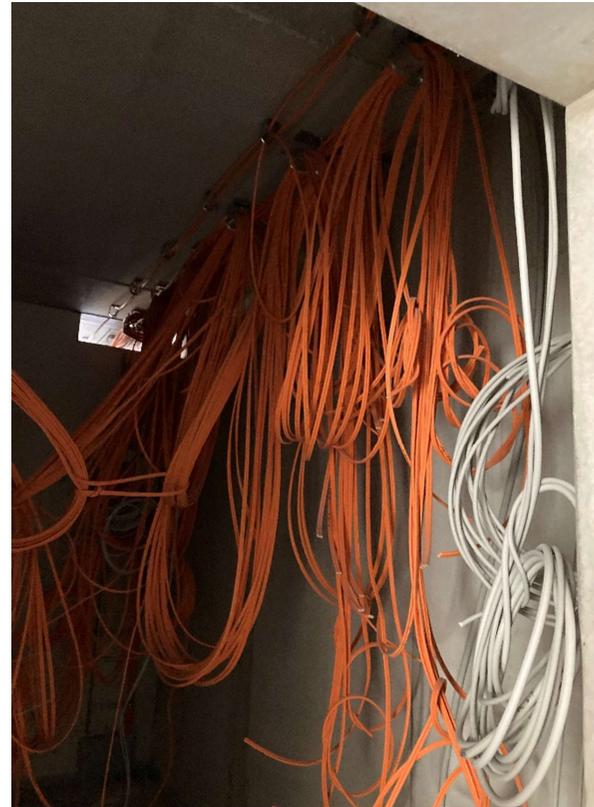



Elektroinstallationen





Treppenhausdachabdeckung



Die Treppenhausabdeckung ist montiert



Sichtbeton Treppenhaus





Dachbegrünung



Dachfläche wird für die Dachbepflanzung vorbereitet



Die Arbeiten an der Dachfläche sind abgeschlossen.

Fotos von ap-technik





Gebäude **Brink**



Folgende Gewerke sind derzeit auf der Baustelle

- **Elektriker**
- **Trockenbauer**
- **Fensterbauer**
- **Lüftungsbauer**
- **Heizungsbauer**
- **Dachdecker**
- **Sanitär**
- **Fassadenisolierer**
- **Glaser**
- **Erdarbeiten**

