



Schulausschuss: TOP 6
– **aktuelle Schulbaumaßnahmen**

Informationen über die Schulbaumaßnahmen in Emmerich am Rhein





Gesamtschule Emmerich

- Gebäude Paaltjessteege
- Gebäude Brink
- Gebäude Grollscher Weg

Liebfrauenschule

- Temporäre Erweiterung

Gebäude Paaltjessteeg

Aktuelle Arbeiten:

- **Restarbeiten / Nacharbeiten**

Aula

- Verdunkelungsanlage
- Erneuerung Bühnenvorhang und Vorhangtechnik

Musikraum



- Anschaffung von Instrumenten und Ausstattung für den Musikunterricht

Differenzierung

- Herstellung von Arbeitsplätzen
(bislang über veraltetes Bestandsmobiliar sichergestellt)

Sanierte Turnhalle



- Anschaffung von kleineren Turngeräten (Bänke, Kästen, etc.)
- Anschaffung von Basketballkörben, Seileinrichtungen u. Kletterwänden



Gebäude Brink

Abgeschlossene Arbeiten:




- Abbrucharbeiten




Gebäude Brink

Aktuelle Arbeiten/Planungen:

- Einrichtung der Baustelle
- Beginn der Hochbauarbeiten

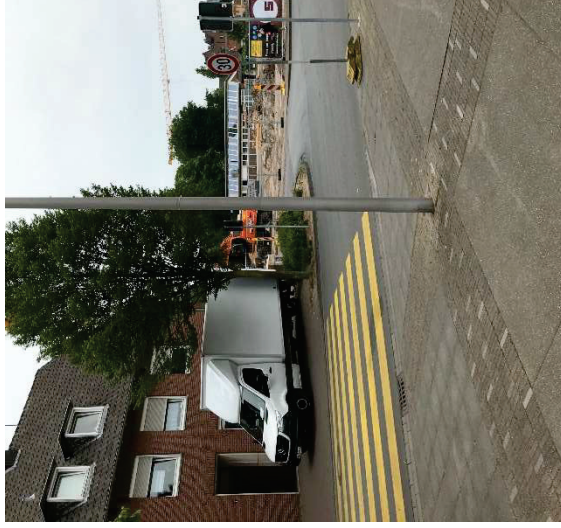


Schulausschuss: TOP 6 – Projektstatusbericht Gesamtschule





Baustelleneinfahrt


Bau-
stellen-
aus-
fahrt




Schulausschuss: TOP 6 – Gesamtschule (Paaltjessteeg)



Schulausschuss: TOP 6 – Projektstatusbericht Gesamtschule





Fund historischer Mauern




Gebäude Grollscher Weg


Planungen:

- Derzeit sind das Architekturbüro und die TGA-Planer in der Grundlagenermittlung





Schulausschuss: TOP 6 – Projektstatusbericht Gesamtschule



Schulcontainer

Herrichtung Grollischer Weg

Errichtung Neubau Brink

Paaltjessteeg

Stand 2018

Stand heute

Sicherung des Wandmosaik
+ 3 Monate


Verzögerung durch Corona
+ 2 - 3 Monate

Verzögerung Archologie
+ ca. 1 Woche

Schulausschuss: TOP 6 – Liebfrauenschule


Liebfrauenschule

Kath. Grundschule der Stadt Emmerich am Rhein




Aktuelle Arbeiten:

- Die Anlage konnte der Schule übergeben werden.



Schulausschuss: TOP 6 – Liebfrauenschule



Schulausschuss: TOP 6 – Liebfrauenschule

