Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen 2012

Anlage 1 TOP 3 ö T
BA-KBE 13.09.2012

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2012
der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein sind mit roter Schrift versehen

Kanalbauphasen:

- Planungsphase
- Ausführungsphase
- Abrechnungsphase
- Straßenausbau nach Fertigstellung des Kanals
- offene Bauweise
- geschlossene Bauweise

Erläuterung Nr.	Bezeichnung		Gesamt 2011 bis 2016 T€	2011 NT T€	2012 Plan T€	2013 Plan T€
1	Maßnahmen in Pumpstationen		630	130	**150**	150
	Kanalerneuerung Innenstadt:					
3	Ostwall / Großer Wall 2. Bauabschnitt		435	435		
4	Parkring		400			400
5	Wallstraße/Burgstraße (2. BA)		315	315		
6	weitere Einzelmaßnahmen:		150	0	**30**	30
	Emmerich sonst:					
8	Arnheimer Straße		20		**20**	
10	Blinder Weg		175	0		
12	Bremer Weg		210			210
13	Diepe Kuhweg (Weseler Straße bis Frankenstraße)	🌳	180	180		
16	Frankenstraße Schachtsanierung)		65	65		
17	Friedenstraße und Gartenstraße	🌳	185	185		
19	Heideweg		80			80
20	Hubert-Fink-Straße/Merowinger Straße	🌳	355		**355**	
21	Karl-Arnold-Straße		40			40
21a	Mathäus-Merian-Straße		200		**200**	
26	Neumarkt		20			20
28	Nollenburger Weg / Bremer Weg		545		**575**	
31	s' Heerenberger Straße	🌳	70			70
32	Schwallspüleinrichtung Hauptsammler Emmerich		150			150
34	Tempelstraße (Schachtsanierung)		35	35		
35	Tempelstraße (Sohlausgleich im Kanal)		50		**50**	
37	Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2		700	0	**100**	150
38	kl. Erschließungsmaßnahmen		250	0	**50**	50
	Elten:					
39	Europastraße / Zevenaarer Straße	🌳	275		**275**	
40	Fortunastraße		125		**125**	
41	Hauberg		220	105		220
42	Im Haag		120		**120**	
43	Klosterstraße	🌳	100			
44	Sanierung Hoch-Elten	🌳	270	175		
45	Wasserstraße (Fremdwasserverminderung)		200			200
46	sonst. Kanalsanierung Elten		220	0	**20**	50
	Hüthum, Borghees u. K.N.:					
48	sonst. Kanalsanierungen		250	0	**50**	50
	Praest, Vrasselt, Dornick:					
50	Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen		150	0	**30**	30
	Gesamtsumme:			1625	**2150**	1900

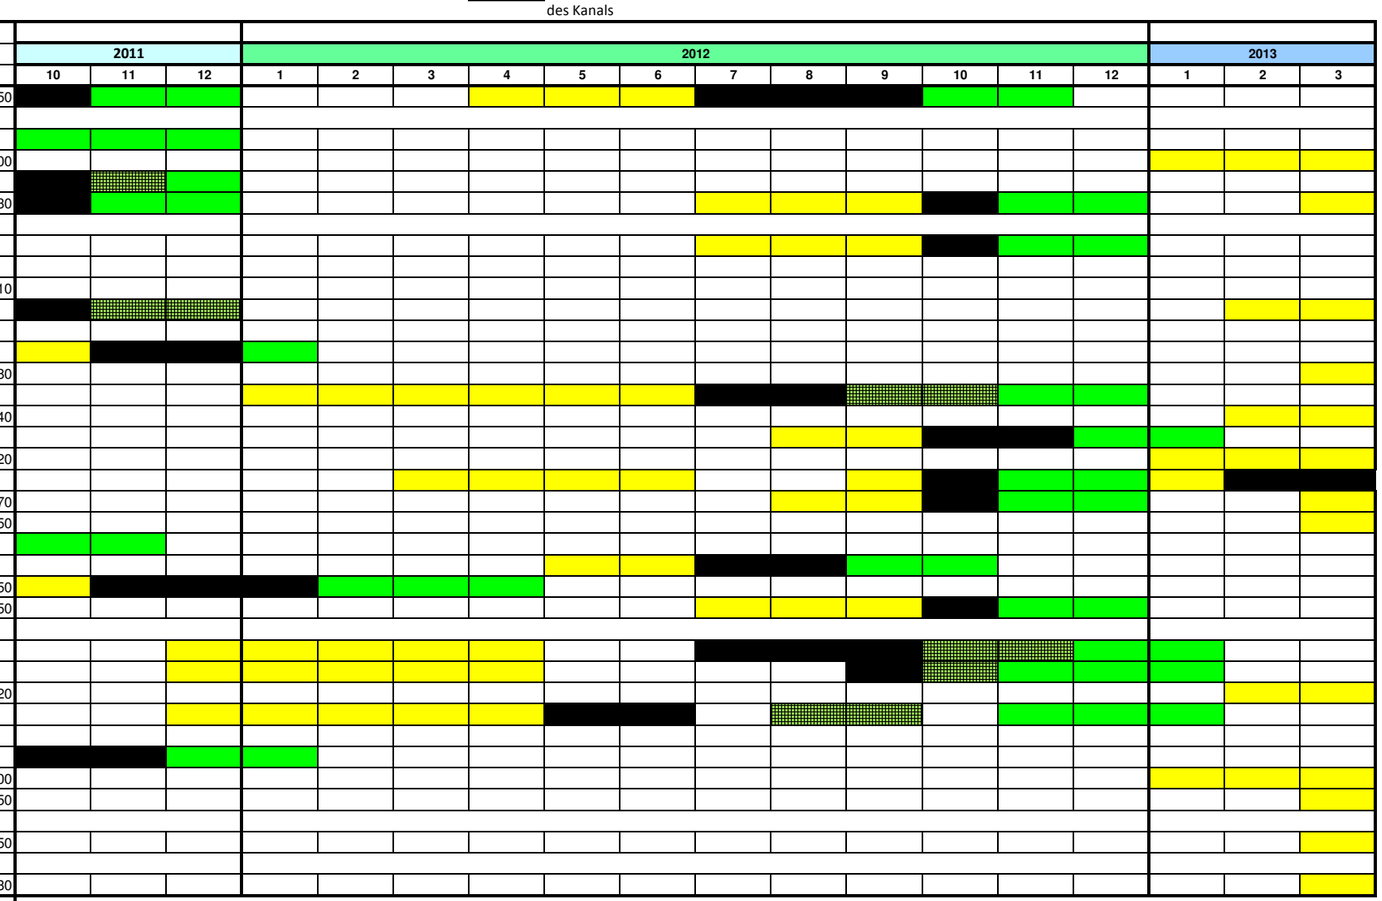

🌳 Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.

Veränderungen gegenüber Plan vom 03.05.2012

8 Die Sanierung in der Arnheimer Straße verschiebt sich um 1 Monat nach hinten.

20 Die Kanalsanierung in der Hubert-Fink-Straße verschiebt sich um einen Monat nach hinten. Der nachfolgende Straßenausbau durch die Stadt Emmerich am Rhein dauert vorauss. bis Ende Oktober an.

21a Die Mathäus-Merian-Straße wurde im Juli 2012 im Zuge der routinemäßigen Kanaluntersuchung inspiziert. Dabei wurden erhebliche Schäden festgestellt, die eine sofortige Erneuerung des in der Wasserzutzzone IIIa befindlichen Kanals erfordern. Insgesamt sind 4 Kanalhaltungen mit einer Gesamtlänge von 330 m und 5 Kanalschächte zu erneuern. Weiter 10 Schächte sind gegen Korrosion zu beschichten. Paralell dazu wird die Ursache der Betonkorrosion ermittelt und abgestellt.

28 Die Kanalsanierung im Nollenbburger Weg beschränkt sich auf die Inlinersanierung, da wegen der noch nicht bewilligten Landesmittel für den Straßenausbau eine Bautätigkeit in offener Bauweise erst 2013 in frage kommt.

31 Der Kanal im Bereich des Bahnübergangs s' Heerenberger Straße ist baulich in einem sehr schlechten Zustand. Wegen des anstehenden Baus einer Bahnunterführung ist hier bisher keine Sanierung erfolgt. Allerdings steht zu befürchten, dass es zu einer Absackung im Bereich des Gleises kommt bevor die Unter führung erstellt ist.
