Europaschule

Vorbereitungen für das Schuljahr 2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis

- Ausgangssituation
- Gebäude Paaltjessteege
- Unterbringung der Europaschule
- Übersicht Luitgardisschule
- Nutzung Luitgardisschule aktuell
- Plan für die Nutzung der Luitgardisschule
- Umsetzung
- Schülerfahrtkosten

Ausgangssituation

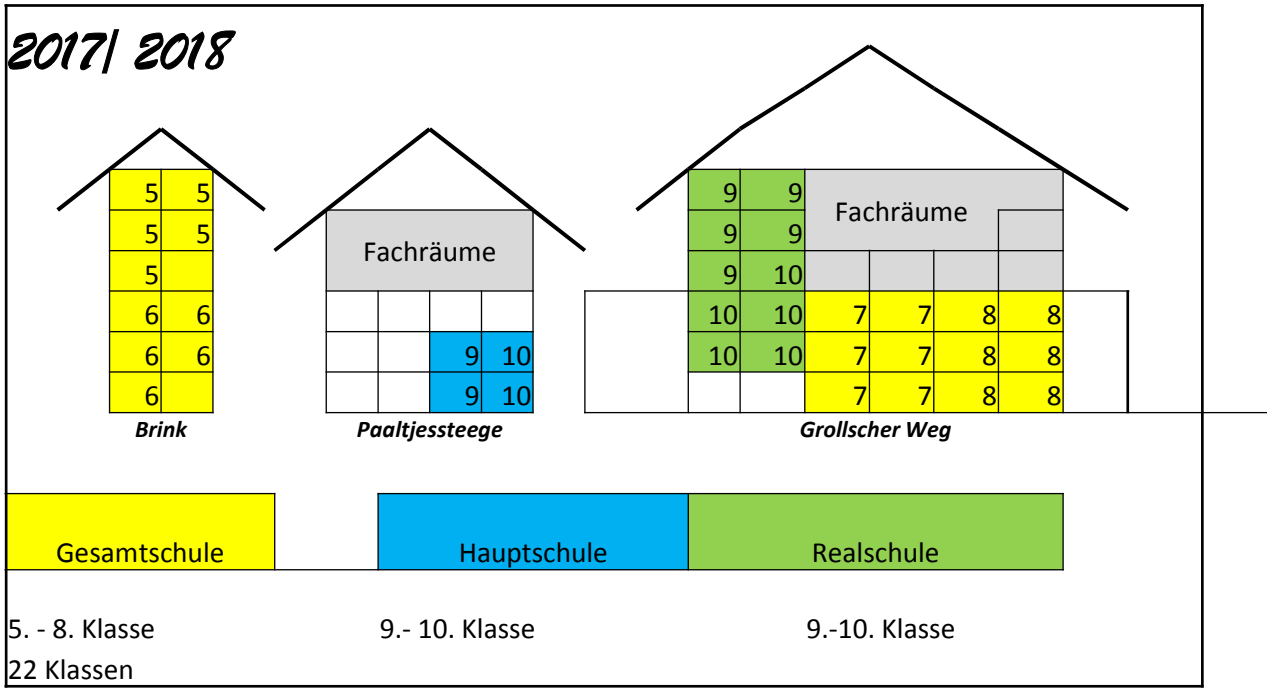

Situation der Gesamt- und der auslaufenden Schulen in Emmerich am Rhein

Ausgangssituation

- Ausbau Brinkgebäude steht aus
  - Zugehörig zum Projekt Gesamtschule
- Ausbau Grollscher Weg steht aus
  - Zugehörig zum Projekt Gesamtschule

- Ausbau Paaltjesstege steht aus
  - Sanierung des Daches Planung 2017
  - Sanierung der Toiletten Planung 2017
  - Zugehörig zum Projekt Gesamtschule
    - Umbau für spätere Nutzung der Gesamtschule

Ablauf

Unterbringung der Europaschule

an der Luitgardisschule Elten

Leerstand Gebäude Paaltjessteege

- Möglichkeit der Sanierung ohne Beeinträchtigung der Schüler oder Lehrkräfte

Fertigstellung Gebäude Paaltjessteege

- Unterbringung der Klassen 5 und 6 der Gesamtschule
- Kein Interim außerhalb für Bau am Brink nötig

Unterbringung der Europaschule

<u>Mögliche Unterbringungslösungen:</u>

1. Luitgardisschule Elten
   - Eigene Immobilie
   - Relativ geringe Herrichtungskosten
   - Nebenkosten für zusätzliche Nutzung vergleichsweise gering
   - Wurde bereits als Hauptschule genutzt

2. Anmietung einer anderen Immobilie
   - Immobilie fraglich
   - Hohe monatliche Kosten

3. Containerlösung
   - Platzproblem
   - Hohe monatliche Kosten

Unterbringung der Europaschule

<u>Mögliche Unterbringungslösungen:</u>

4. Willibrord Gymnasium
   - Lediglich möglich in den Räumlichkeiten der AWO
   - Fehlende Fachräume für Werken und Hauswirtschaft

5. Rheinschule Rees – Hauptschule in Rees
   - Verfrühter Schulbeginn 07:30 Uhr
     (Schwierigkeit für entfernt wohnende SuS)
   - Fragliche Kapazität
   - Fragliche Unterbringung des Verwaltungstraktes
   - Ansonsten Schulauflösung entgegen des Beschlusses des Rates
     - ➢ Hauptschule in Emmerich auslaufen lassen

Luitgardisschule
plausibelste Lösung
für die Europaschule

Bergstraße
Emmericher Straße
B 8
Sporthalle
Luitgardis
Grundschule

Luitgardisschule aktuell

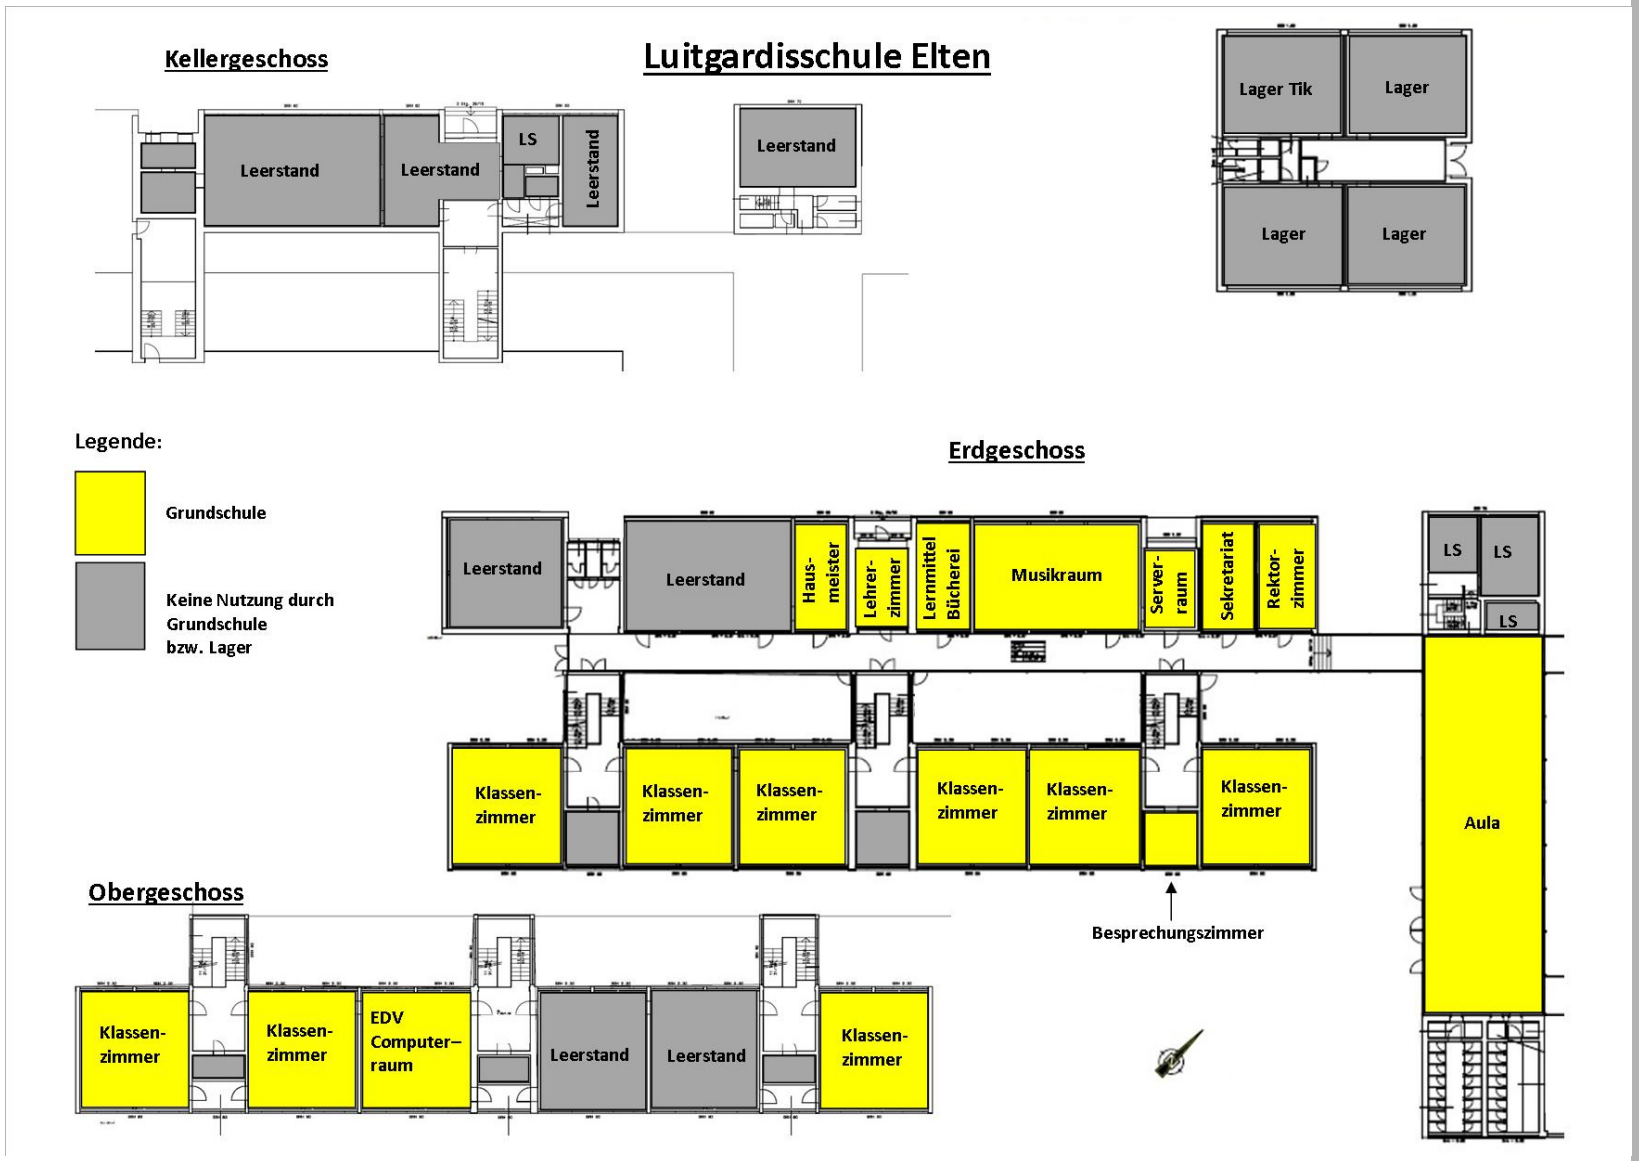

Plan Luitgardisschule

Luitgardisschule Elten

Kellergeschoss

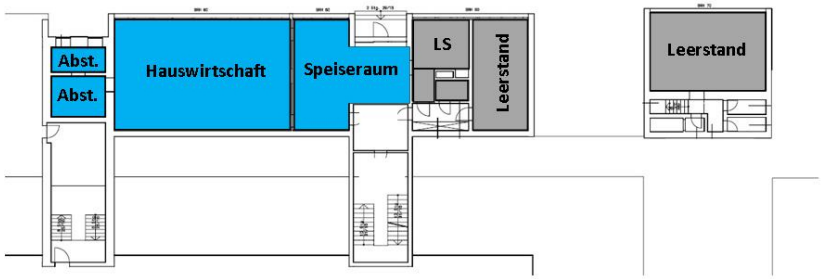

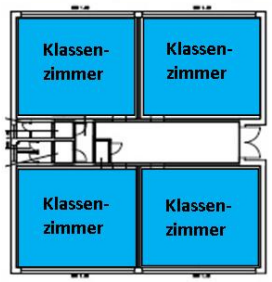

Legende:

- Grundschule
- Hauptschule
- gemeinsame Räume
- Nutzung nicht vorgesehen bzw. Lagerraum

Erdgeschoss

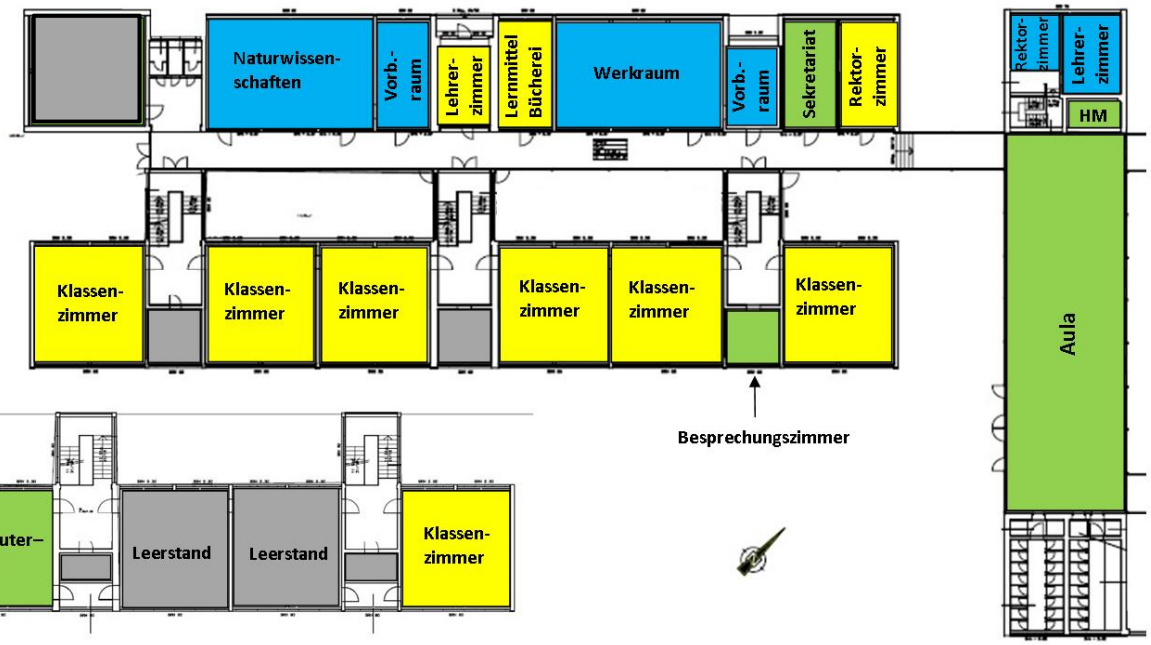

Obergeschoss



Plan Luitgardisschule aktuell

Luitgardisschule Elten

Kellergeschoss

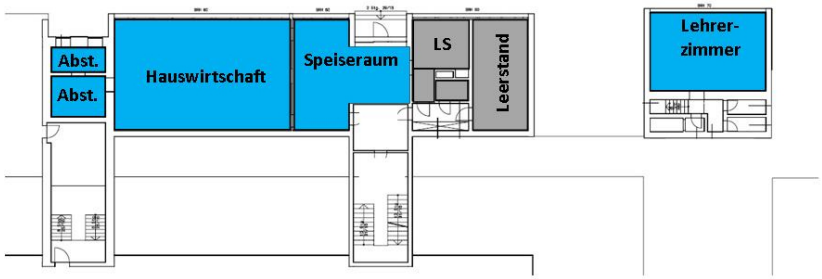

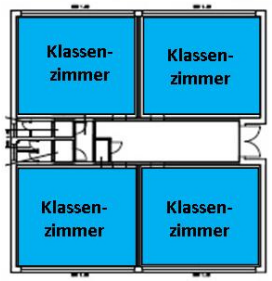

Legende:

- Grundschule
- Hauptschule
- gemeinsame Räume
- Nutzung nicht vorgesehen bzw. Lagerraum

Erdgeschoss

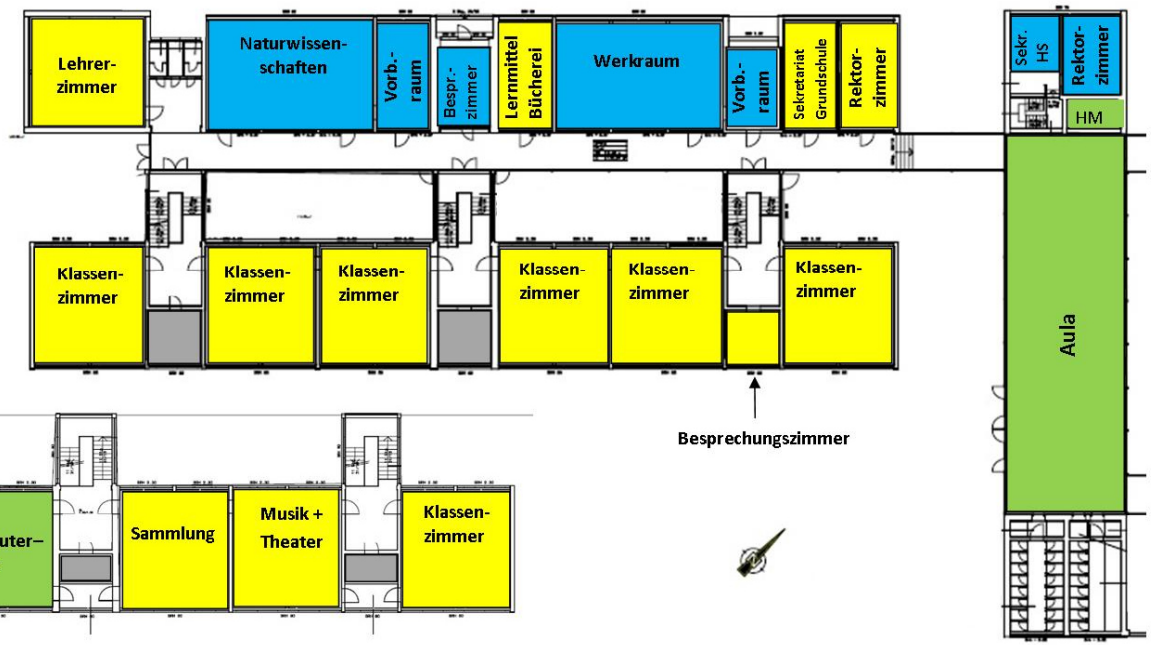

Obergeschoss



Umsetzung

- Herrichtung der Räume bis zum Beginn der Sommerferien
- Informationsveranstaltung und Informationsschreiben für die Eltern
  - Informationen über den Umzug
  - Falls nötig Antragsunterlagen für die Übernahme von Schülerfahrtkosten

Umsetzung

Maßnahmen im Untergeschoss:

- Herrichtung Hauswirtschaftsraum
- Herrichtung Speiseraum
- Herrichtung der Abstellräume

Maßnahmen im 1. Obergeschoss:

- EDV Verkabelung erneuern
- Aufrüstung des vorhandenen Computerraumes

Maßnahmen im Erdgeschoss:

- Erstellung von vier Klassenzimmern im Pavillon
- Herrichtung des Rektor- und Lehrerzimmers
- Umwandlung des Musikraumes zum Werkraum
- Servereinfriedung im Vorbereitungsraum des Werkraumes
- Herrichtung des Naturwissenschaftsraumes
- Umzug des Hausmeisters aus dem Vorbereitungsraum und entsprechende Reaktivierung

Schülerfahrtkosten

- Aktuell 22 SuS mit SchokoTicket

<u>Nach der voraussichtlichen Planung der Hauptschule in Elten:</u>

- 10 SuS aus Elten werden kein Ticket mehr benötigen
- 63 SuS aus dem Stadtgebiet Emmerich werden ein Ticket benötigen

Gesamt: 75 SuS mit SchokoTicket

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
